

平成29年 第1回 筑紫野市議会定例会議（3月）

建設環境常任委員会説明資料

建設部 河川課



平成29年 第1回 筑紫野市議会定例会（3月）

建設環境常任委員会への報告

建設部 河川課

「県営高尾川・県営鷺田川改修事業の進捗について」


1. 県営高尾川・鷺田川の進捗




# 県営高尾川・県営鷺田川 改修事業の進捗について



## ①高尾川床上浸水対策特別緊急事業

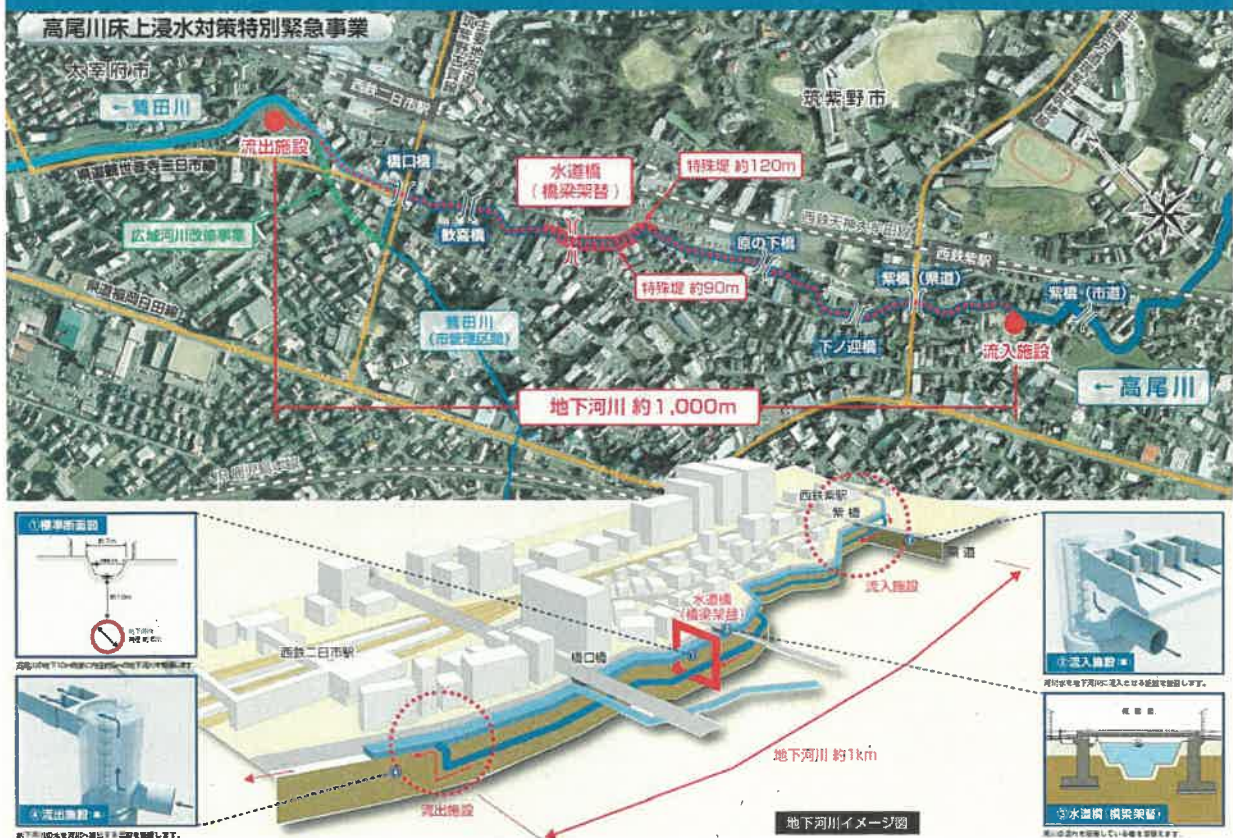

## ①-1 流入施設側護岸工事

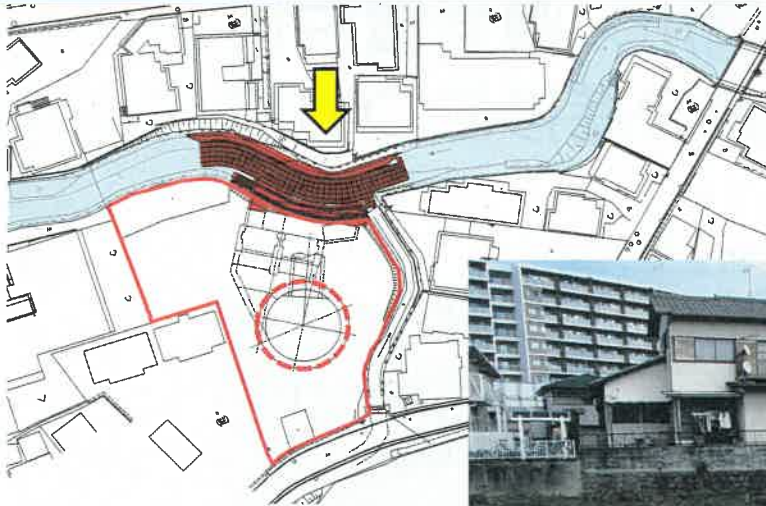

- 3月末完了予定
- 4月～ 流入立坑工事




## ①-2 水道橋架替工事




- ～3月：下部工、上部工、  
特殊堤設置（左岸側）
- 4月～：上下水道工事、取付道路、  
特殊堤設置（右岸側）




## ② 鷺田川河川改修工事

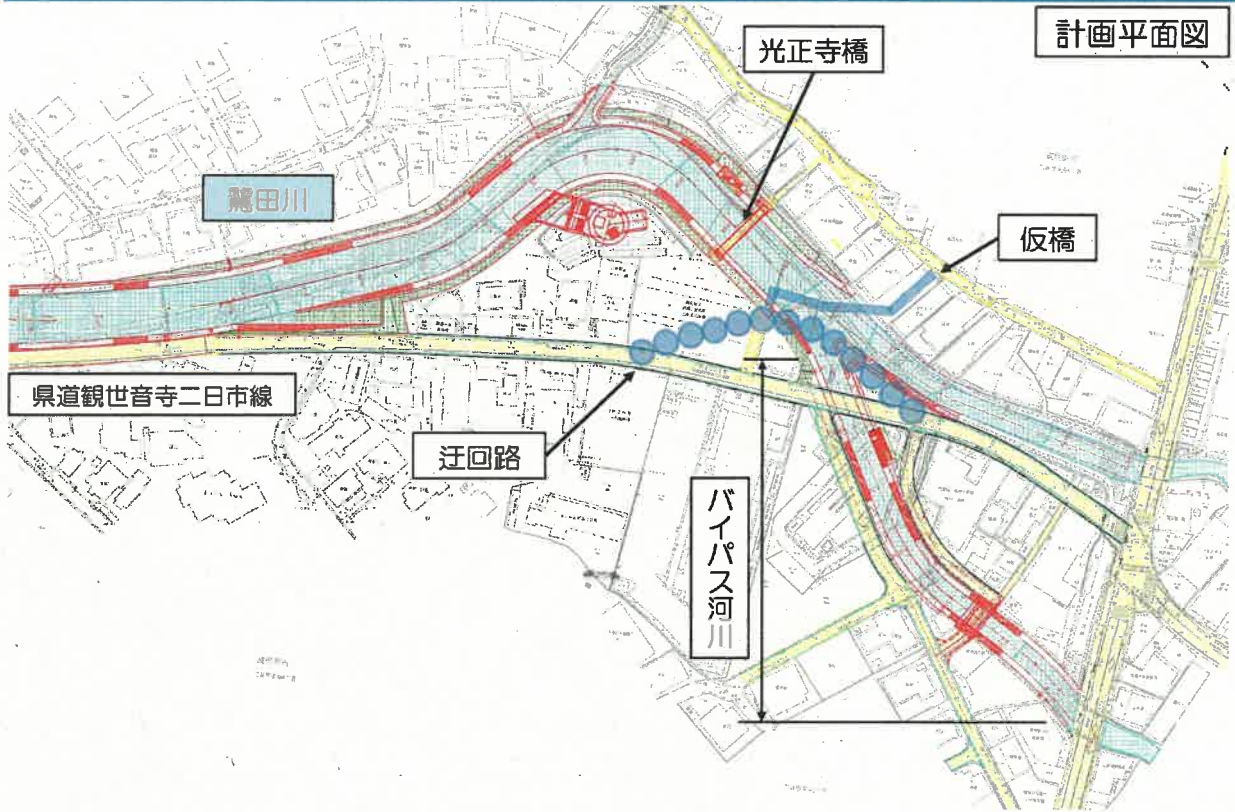

### ②-1 護岸工事

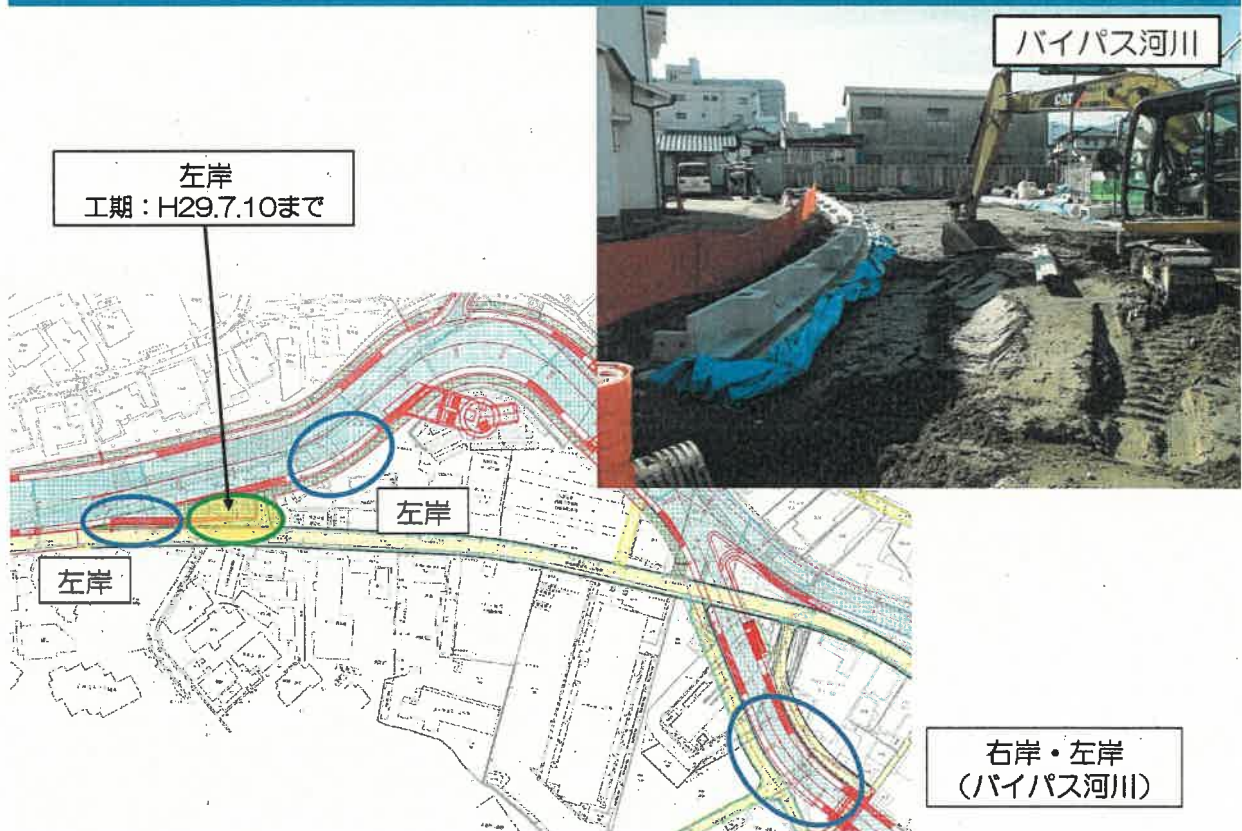


## ②-2 函渠設置工事（ボックスカルバート）

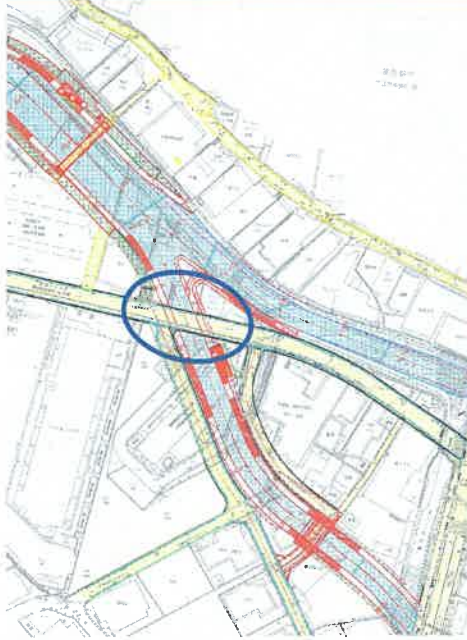

- 高欄設置を行い、3月末完了予定
- 取付工事後、県道を交通解放



## ②-3 光正寺橋架替工事（上部工）

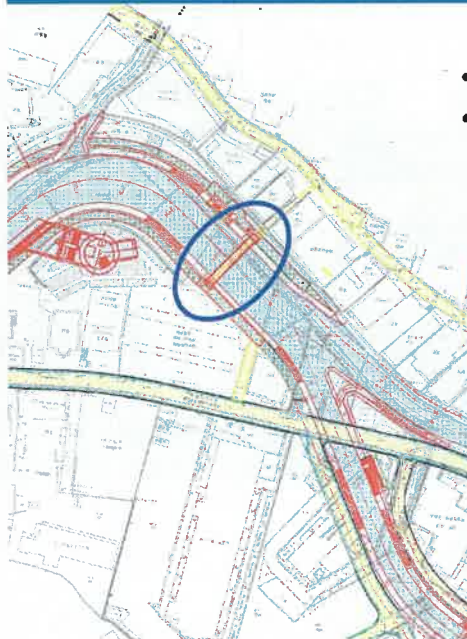

- 高欄設置を行い、3月末完了予定
- 県道迂回路撤去および西鉄二日市駅駐輪場周辺の通路整備後に供用開始






3月6日撮影



高尾川床対事業の平成28年度の予定  
(1) 地下河川築造工事

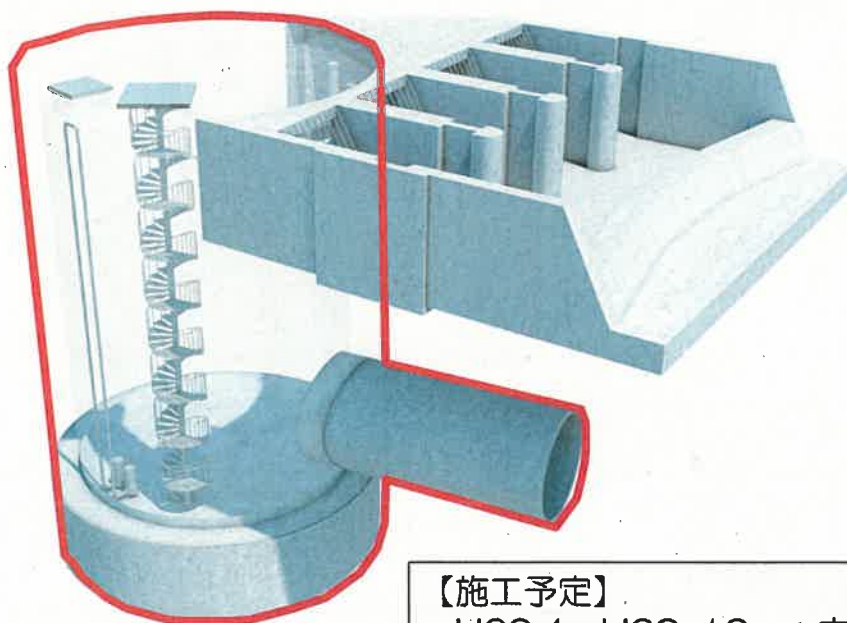

【施工予定】

H29.4~H29.12 : 立抗築造工事

H30.1~H31.3 : シールド工事

高尾川床対事業の平成28年度の予定  
 (1) 地下河川築造工事



【進捗状況】

流入立坑と地下を掘り進むシールド工事を発注


- 平成28年11月：仮契約
- 平成28年12月：県議会により施工業者決定予定



施工予定：平成29年4月（予定）～平成31年3月（予定）

写真 シールドマシンの例

高尾川床対事業の平成28年度の予定  
 (3) 流入施設側護岸工事

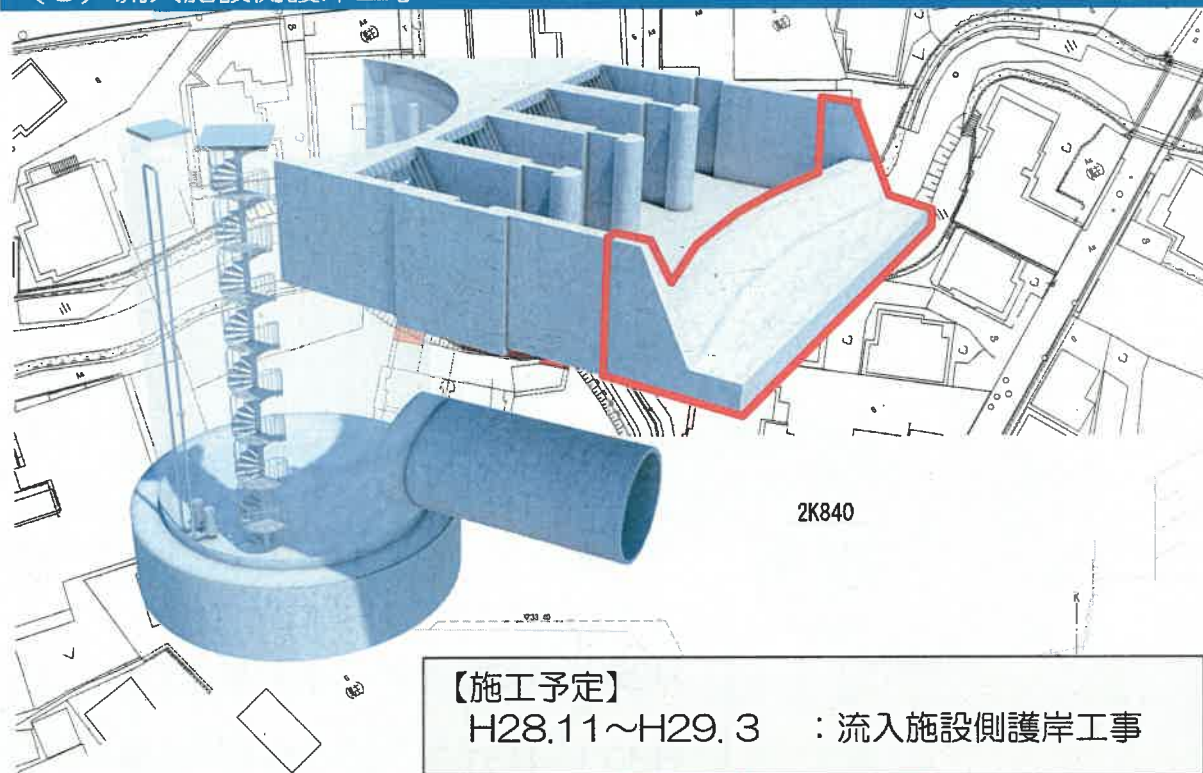

【施工予定】  
 H28.11～H29.3 : 流入施設側護岸工事

護床ブロック  
 (コンクリート製)

# ①-2 水道橋架替工事

# 追加資料

3月6日撮影



